

## **Realizowane inwestycje** (stan na 30.04.2021r.)

1. Przebudowa drogi gminnej nr 430203W (ul. Słoneczna) w miejscowości Sulejów  
- wykonano całość prac. W dniu 29.04.2021 r. dokonano odbioru i przekazano inwestycję do użytku.



2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ulicy M. Zawiszy w miejscowości Zawiszyn  
- Wykonano podbudowę oraz część nawierzchni z kostki betonowej, a także parking. Trwają prace przy wykonywaniu nawierzchni na łukach drogi. Zakończenie prac planowane jest na 31.05.2021 r.



3. Budowa drogi gminnej - ulicy Kąpielowej w miejscowości Borzemy - Wykonano część podbudowy oraz ustawiono krawężniki. Zakończenie prac planowane jest na 31.05.2021 r.



4. Budowa drogi gminnej nr 430201W na odcinku od drogi gminnej nr 430217W ( ul. Zielona Droga ) do drogi powiatowej nr 4330W w miejscowości Jadów (droga koło PSZOK) - Wykonano roboty przygotowawcze. Zakończenie prac planowane jest na 31.07.2021. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.






5. Modernizacja budynku i zagospodarowania terenu OSP w Wólce Sulejowskiej – modernizacja budynku. Wykonano już większość prac, trwają prace wykończeniowe i uprzątnięty jest teren budowy. Zakończenie prac planowane jest na 30.04.2021 r.



6. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach - wykonano już konstrukcję budynku, w tym ściany nośne, wykonano stropodach. Zakończenie prac planowane jest na 16.08.2021 r.



7. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starowola – Wykonano wszystkie zaplanowane prace, wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. Odbiór końcowy wyznaczono na 11.05.2021 r.

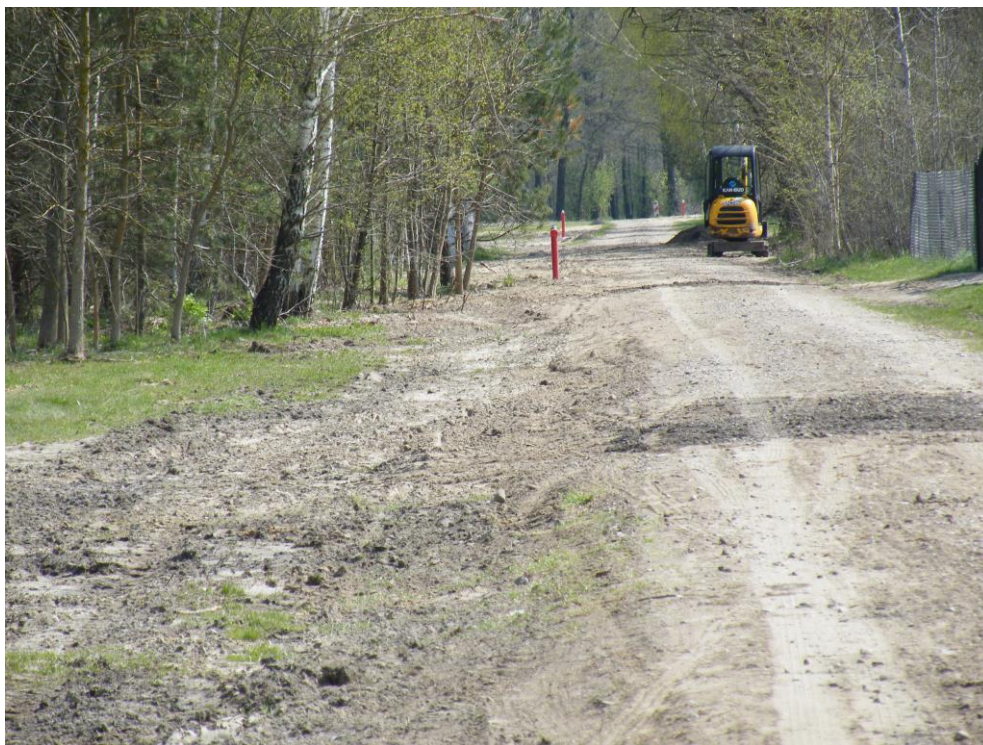

8. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Jadów oraz remont pomieszczeń urzędu - Wykonano już rurociągi kanalizacji oraz instalację do zasilania i sterowania w skrzydle B budynku, wygładzono ściany, wykonano zabudowę rurociągów, trwa malowanie ścian i układanie płytek na posadzkach. Zakończenie prac planowane jest na 31.08.2021 r.

